



ООО «СКАД»

630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, дом 3/1,
комната 327; тел/факс: (383) 3303-133, 3303-660,
ИНН 5408028989, КПП 540801001

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО "СКАД"

 Г.Р. Сурова

2023 г.



ОТЧЁТ

**по строительному контролю за ремонтом автомобильной дороги
общего пользования местного значения по ул. Сибирская в с. Гусиный
Брод**

г. Новосибирск 2023 г.

Муниципальный контракт:	№ 2023-289-ЕП от 17.07.2023 г.	Заказчик:	Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Объект:	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сибирская в с. Гусиный Брод	Подрядчик:	ООО "ГРАНТ 2"

ОТЧЁТ

Об оказании услуг по осуществлению функций строительного контроля за ремонтом автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сибирская в с. Гусиный Брод

Содержание отчета:

Раздел	Наименование раздела, документа	Номера страниц
1	Краткое описание услуг, выполненных в отчетный период.	3
	-Таблица объемов выполненных работ	3
2	Мероприятия по контролю качества.	3
3	Соблюдение подрядчиком графика производства работ.	3
4	Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта	4
5	Сведения об изменениях на объекте	4
6	Происшествия на объекте	4
	Заключение	4
	Приложения:	
	П1. Дневник службы строительного контроля	5
	П2. Перечень актов приемки работ	8
	П3. Перечень предписаний и замечаний	10
	П4. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий	12
	П5. Ведомость результатов испытаний строительных материалов по данным подрядчиков	14
	П6. Результаты испытаний строительных материалов, выполняемых Исполнителем	16
	П7. Геодезическая документация	19
	П8. Фотографическая документация	21

Муниципальный контракт:	№ 2023-289-ЕП от 17.07.2023 г.	Заказчик:	Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Объект:	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сибирская в с. Гусиный Брод	Подрядчик:	ООО "ГРАНТ 2"

Раздел 1. Краткое описание услуг, выполненных в отчетный период

Подрядчиком ООО "ГРАНТ 2" за отчетный период выполнены следующие работы:

№ п/п	Вид выполненных работ	Ед. изм.	Количество
	Раздел 1. Разбивочные работы		
1	Восстановление оси трассы IV категории автомобильной дороги на местности категория сложности 1	1 км	0.643
2	Закрепление оси трассы IV категории автомобильной дороги на местности категория сложности 1	1 км	0.643
	Раздел 1. Дорожная одежда		
1	Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала	1000 м2	4.8091365
2	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 12 см	1000 м2	4.23
3	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм	м3	674.95
	Устройство призм сгона		
4	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см	1000 м2	0.4767
5	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм	м3	72.1

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества

В отчетный период в процессе оказания услуг по строительному контролю недостатки в работе Подрядчика выявлены не были

В отчетный период, в процессе оказания услуг по строительному контролю, были отобраны и испытаны следующие дорожно-строительные материалы:

- ЩПС С1

Дорожно-строительные материалы, отобранные при операционном и приемочном контроле, согласно результатам лабораторных испытаний, представленных в приложении 6, соответствуют требованиям нормативной документации и пригодны для дорожного строительства. Результаты лабораторных испытаний совпадают с результатами генерального подрядчика.

Раздел 3. Соблюдение графика работ.

Выполнение основных этапов и видов работ в отчетный период было осуществлено в рамках существующего календарного графика.

Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта

В ходе реализации проекта не возникало проблем и ситуаций, ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения ремонта объекта

Раздел 5. Сведения об изменениях на объекте.

В отчетный период согласно протокола технического совета №1 от 01.08.2023 г. было принято решение взамен работ по ликвидации пучинообразования выполнить увеличение объемов работ по исправлению профиля без добавления нового материала и устройству покрытия из ЩПС, принять корректировку локального сметного расчета без изменения сметной стоимости муниципального контракта

Раздел 6. Происшествия на объекте.

В отчетный период на объекте не наблюдалось никаких происшествий, влияющих на безопасность, качество и сроки выполнения работ

Заключение

Объем выполненных работ, геометрические параметры автомобильной дороги соответствует требованиям проектно-сметной документации.

Дорожно-строительные материалы, отобранные при операционном и приемочном контроле, согласно результатам лабораторных испытаний, представленных в приложении 6, соответствуют требованиям нормативной документации и пригодны для дорожного строительства. Результаты лабораторных испытаний совпадают с результатами генерального подрядчика.

В ходе реализации проекта не возникало проблем и ситуаций, ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения ремонта объекта

Автомобильная дорога рекомендуется к приемке в эксплуатацию.

Начальник отдела контроля качества
ООО "СКАД"



А.В. Плетенкин

Приложение 1

Дневник службы строительного контроля


Муниципальный контракт:	№ 2023-289-ЕП от 17.07.2023 г.	Заказчик:	Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Объект:	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сибирская в с. Гусиный Брод	Подрядчик:	ООО "ГРАНТ 2"

Дневник службы строительного контроля

Дата	Погода, температура, осадки	Описание работ Подрядчика	Описание услуг службы строительного контроля	Примечание
8/1/2023	+25 °С, облачно	Восстановление и закрепление оси трассы	Контроль качества выполненных работ.	Работы выполнены в соответствии с требованием проекта.
8/5/2023	+27 °С, облачно	Исправление профиля без добавления нового материала	Контроль качества выполненных работ. Проверка качества уплотнения путем контрольного прохода катка.	Работы выполнены в соответствии с требованием проекта. После контрольного прохода катка не оставалось следа и не возникало волны перед вальцом.
8/6/2023	+20 °С, ясно	Исправление профиля без добавления нового материала	Контроль качества выполненных работ. Проверка качества уплотнения путем контрольного прохода катка.	Работы выполнены в соответствии с требованием проекта. После контрольного прохода катка не оставалось следа и не возникало волны перед вальцом.
8/13/2023	+17 °С, облачно	Устройство покрытия из щебеночно-песчаных смесей: серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 12 см	Контроль качества выполненных работ. Отбор проб ЩПС.	Работы выполнены в соответствии с требованием проекта. Протоколы лабораторных испытаний представлены в приложении 6.

Дата	Погода, температура, осадки	Описание работ Подрядчика	Описание услуг службы строительного контроля	Примечание
14.08.2023	+13 °С, пасмурно	Устройство покрытия из щебеночно-песчаных смесей: серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 12 см	Контроль качества выполненных работ. Измерение геометрических параметров. Проверка качества уплотнения путем контрольного прохода катка.	Работы выполнены в соответствии с требованием проекта. После контрольного прохода катка не оставалось следа и не возникало волны перед вальцом. Ведомость представлена в Приложении 7
15.08.2023	+17 °С, пасмурно	Устройство призм стонов из щебеночно-песчаных смесей	Контроль качества выполненных работ. Измерение геометрических параметров. Проверка качества уплотнения путем контрольного прохода катка.	Работы выполнены в соответствии с требованием проекта. После контрольного прохода катка не оставалось следа и не возникало волны перед вальцом. Ведомость представлена в Приложении 7

Начальник отдела контроля качества ООО "СКАД"



А.В. Плетенкин

Приложение 2

Перечень актов приемки работ

Муниципальный контракт:	№ 2023-289-ЕП от 17.07.2023 г.	Заказчик:	Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Объект:	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сибирская в с. Гусиный Брод	Подрядчик:	ООО "ГРАНТ 2"

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ПРИЕМКИ РАБОТ

№ п/п	Наименование документа	Дата	Номер
1	Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности	01.08.2023	1
2	Акт освидетельствования скрытых работ. Исправление профиля существующего основания без добавления нового материала	06.08.2023	2
3	Акт освидетельствования ответственных конструкций. Устройство покрытия из ЩПС С1 толщиной 12 см	15.08.2023	3

Начальник отдела контроля качества
ООО "СКАД"

А.В. Плетенкин

Приложение 3


Перечень предписаний и замечаний

Муниципальный контракт:	№ 2023-289-ЕП от 17.07.2023 г.	Заказчик:	Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Объект:	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сибирская в с. Гусиный Брод	Подрядчик:	ООО "ГРАНТ 2"

ПЕРЕЧЕНЬ
замечаний службы строительного контроля

№ п/п	Дата выдачи	Форма выдачи	Краткое содержание	Отметка о выполнении
В отчетный период в процессе оказания услуг по строительному контролю недостатки в работе Подрядчика выявлены не были				

Начальник отдела контроля качества
ООО "СКАД"



А.В. Плетенкин

Приложение 4

Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий


Муниципальный контракт:	№ 2023-289-ЕП от 17.07.2023 г.	Заказчик:	Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Объект:	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сибирская в с. Гусиный Брод	Подрядчик:	ООО "ГРАНТ 2"

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, подтверждающих качество материалов и изделий

№ п/п	Наименование документа	Наименование поставщика	Номер документа	Дата	Примечание
1	Сертификат соответствия на ЦПС	АО "Алтайвзрывпром"	РОСС RU.НЕ36. H00031	07.12.2022	
1	Паспорт на ЦПС С1	АО "Алтайвзрывпром"	223	02.06.2023	

Начальник отдела контроля качества
ООО "СКАД"



А.В. Плетенкин

Приложение 5


**Ведомость результатов испытаний
строительных материалов по данным
подрядчиков**

Муниципальный контракт:	№ 2023-289-ЕП от 17.07.2023 г.	Заказчик:	Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Объект:	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сибирская в с. Гусиный Брод	Подрядчик:	ООО "ГРАНТ 2"

Ведомость результатов испытаний строительных материалов (и грунтов) по данным Подрядчика

№ п/п	Дата	Наименование испытываемого материала	Наименование элемента сооружения	Где и кем проводились испытания	Требование проекта	Результаты испытаний
1	10.08.23.	ЩПС С1	Покрытие	АО "Новосибирскавтодор"	ГОСТ 25607-2009	Соответствует ГОСТ 25607-2009

Начальник отдела контроля качества ООО "СКАД"



А.В. Плетенкин

Приложение 6

**Результаты испытаний строительных
материалов, выполняемых Исполнителем**

Муниципальный контракт:	№ 2023-289-ЕП от 17.07.2023 г.	Заказчик:	Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Объект:	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сибирская в с. Гусиный Брод	Подрядчик:	ООО "ГРАНТ 2"

**Результаты испытаний строительных материалов (и грунтов), выполняемых строительным контролем с оценкой достоверности
испытаний, выполненных Подрядчиком**

№ п/п	Дата	Наименование испытываемого материала	Наименование элемента сооружения	Где и кем проводились испытания	Требование проекта	Результаты испытаний	Оценка достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком
1	14.08.23.	ЩПС С1	Покрытие	ИЛ ООО "СКАД"	ГОСТ 25607-2009	Соответствует ГОСТ 25607-2009	Результаты испытаний совпадают

Начальник отдела контроля качества ООО "СКАД"

А.В. Плетенкин



ООО «СКАД»

630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, дом 3/1,

комната 327; тел/факс: (383) 3303-133, 3303-660,

e-mail:skad_nsk@mail.ru

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.10HA453

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 14/08/23 от 14.08.2023 г.

1. Общие сведения

Основание для проведения испытаний	Муниципальный контракт № 2023-289-ЕП от 17.07.2023 г.
Наименование объекта испытаний	Щебеночно-песчаная смесь С1 фр. 0-40 мм.
Наименование и адрес Заказчика	Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Наименование объекта	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сибирская в с. Гусиный Брод
Производитель работ	ООО "ГРАНТ 2"
Адрес места отбора образцов (проб)	ул. Сибирская
Назначение материала	Устройство покрытия автомобильной дороги
НД на объект испытаний	ГОСТ 25607-2009
План и метод отбора образцов	ГОСТ 8269.0-97 п.4.2
НД на методы испытаний	ГОСТ 25607-2009 п.5.2; п.5.9; п.5.7; п.5.10; п.5.8; п.5.1; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7.1; п. 4.8.
Вид контроля	Входной
Описание, идентификация и состояние образцов	Щебеночно-песчаная смесь. Количество пробы 60 кг. Проба без видимых примесей и загрязнений, упаковка – п/э мешок без повреждений.
Дата отбора	13.08.2023 г.
Дата(ы) проведения испытаний	14.08.2023 г.
Условия проведения испытаний	температура от + 20 °С, влажность 56 %

2. Результаты испытаний

таблица 1

Измеряемый показатель	Ед. изм.	Нормативный документ		Значения показателя		Примечание
		на объект	на метод	нормативное	фактическое	
1	2	3	4	5	6	7
зерновой состав готовой смеси – полный остаток на ситах: 40 мм 20 мм 10 мм 5 мм 2,5 мм 0,63 мм 0,16 мм 0,05 мм	% по массе	ГОСТ 25607-2009	ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-55	0-10 20-40 35-60 45-70 55-80 70-90 75-92 80-93	1,12 23,89 40,62 52,98 70,18 82,89 90,83 91,93	Соответствует
марка по пластичности готовой смеси (число пластичности)		ГОСТ 25607-2009	ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 5180-2015 ГОСТ 25100-2011	до 1 вкл. (Пл1) св. 1 до 5 (Пл2) св. 5 до 7 (Пл3)	0,70	марка Пл1
содержание пылевидных и глинистых частиц в готовых смесях (размером менее 0,05 мм)	% по массе	ГОСТ 25607-2009	ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-55	7-20	8,07	Соответствует
водостойкость щебня, входящего в состав смеси - потеря массы при испытании (марка по водостойкости)	%	ГОСТ 25607-2009	ГОСТ 25607-2009	до 1 вкл. (В1) св.1 до 3 (В2)	0,32	марка В1
содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	% по массе	ГОСТ 25607-2009	ГОСТ 8269.0-97	не более 35	33,7	Соответствует
содержание глины в комках	% по массе	ГОСТ 25607-2009	ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88	не более 10	0	Соответствует
дробимость: потеря массы при испытании в сухом состоянии, (марка по дробимости)	%	ГОСТ 25607-2009	ГОСТ 8269.0-97	не ниже 400	1400	Соответствует

Заключение: Испытанная щебеночно-песчаная смесь соответствует требованиям ГОСТ 25607-2009, пригодна для устройства покрытия автомобильных дорог.



Испытания провел: ведущий инженер

С.В. Коновалов

18

Приложение 7

Геодезическая документация

Ведомость контрольных промеров
 ширины, толщины и ровности щебеночно-песчаного покрытия:
 ул. Сибирская, с. Гусиный Брод

ПК	Ширина, м	Толщина, см		Количество промеров под 3-метровой рейкой в продольном направлении, шт			Ср. ширина, м	Площадь, м2
		проект	факт	до 7 мм	до 15 мм	>15мм		
0+00	6,55	12,0	12,5	5	0	0	6,58	4230
1+00	6,60	12,0	12,5	5	0	0		
2+00	6,55	12,0	12,3	5	0	0		
3+00	6,62	12,0	12,7	5	0	0		
4+00	6,60	12,0	14,0	5	0	0		
5+00	6,55	12,0	14,0	5	0	0		
6+00	6,60	12,0	15,0	5	0	0		
6+43	6,65	12,0	13,0	5	0	0		
призмы сгона								478


Начальник отдела контроля качества ООО "СКАД"



А.В. Плетенкин

Приложение 8


Фотографическая документация

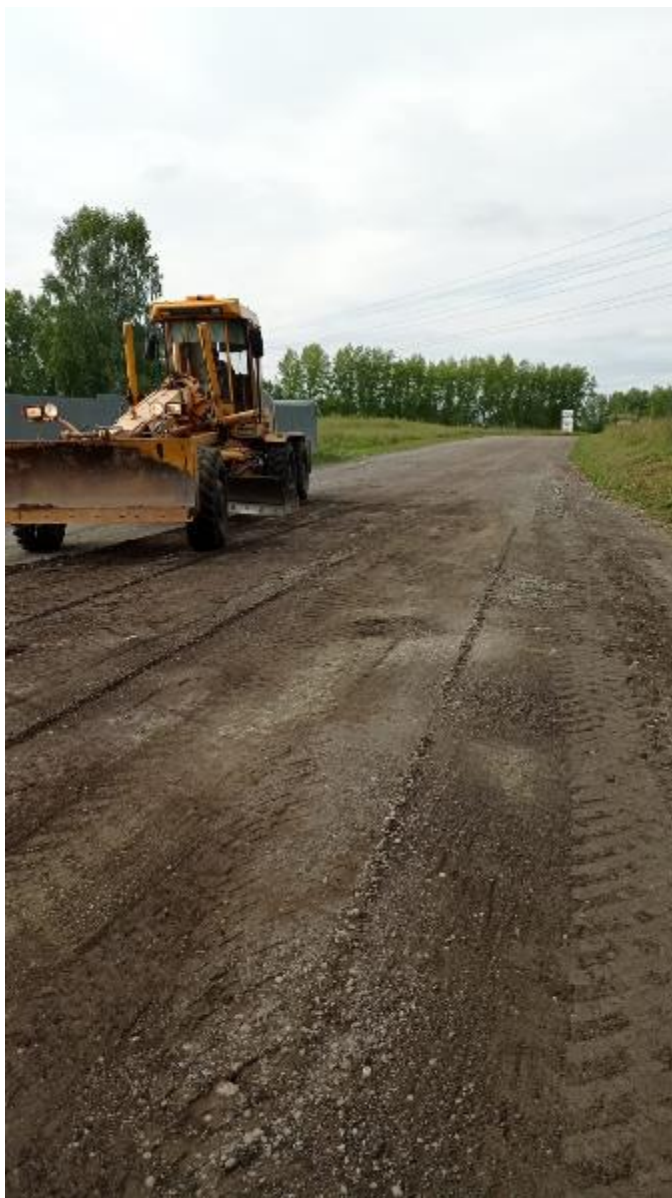

Исправление профиля без добавления нового материала



Устройство покрытия из ЦПС С1

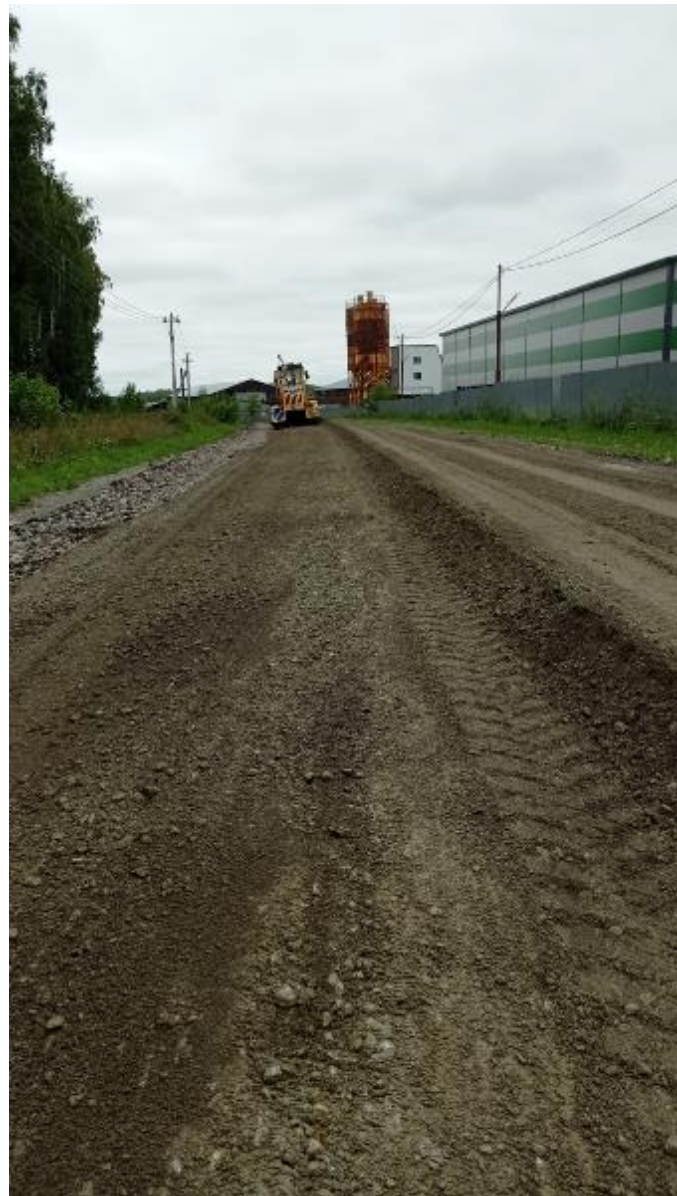

Устройство покрытия из ЩПС С1



Устройство покрытия из ЩПС С1



Устройство покрытия из ЩПС С1
